

Dies ist die Geschichte eines Tiny-House-Projekts... eine lange Geschichte... die letzten drei Monate zusammengefasst in Bildern auf drei Seiten


☞ <https://www.vision-futurae.ch/tiny-house-probewohnen>

September 2019: Transport nach Sörenberg & Aufstellen

- ☞ <https://www.facebook.com/markusmuehlbacher.ch/posts/138906224056215>
- ☞ http://www.tele1.ch/artikel/157116/mini-haeuser-sind-im-trend?fbclid=IwAR1hU50VSrxtdR48zOPA74YwSlAFxvLao-TElfF-KtKKY_hVp8TvCXcZtaoA
- ☞ https://docs.wixstatic.com/ugd/2c228a_24de32fd8c664da8b1af8d059bce5750.pdf?fbclid=IwAR38AByeXJjofe6G1zYEXggHf85E1k9arpKdODLgrfL6OylUSPi-1pQeH58



Oktober 2019: Feststellung zahlreicher und tw. gravierender Liefermängel & Einbau von Notlösungen: Komponenten ohne Schweizer Service; kein Wasserautarkiesystem (kein Wasseranschluss vor Ort!), kein Wasserablauf, Solaranlage funktioniert nicht, kein Hut auf dem Kamin (es regnet hinein), nicht funktionierende Eingangstüre, zerborstenes Fensterglas, Gas-Durchlauferhitzer funktioniert nicht etc.; endlose Mails, Whatsapps und Telefonate; Notlösungen installieren, Lieferfirma meldet Insolvenz an und erklärt sich „nicht mehr zuständig“...

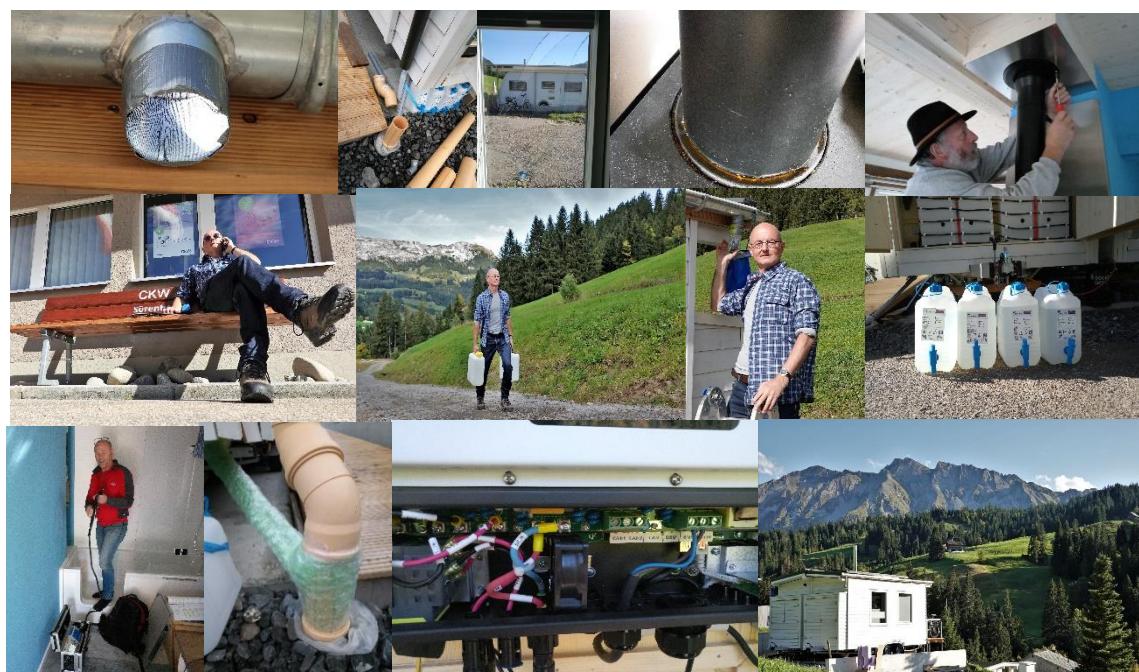

November 2019: laufende Behebung von Liefermängeln, weitere Inneneinrichtung; erste Probebewohner im Haus. Feststellung weiterer Liefermängel; erste Frostnächte; erste Schneetage, Sturmschäden, mehrere vorerst ungeklärte Stromausfälle;; Behebung von Falschlieferung von Zubehör; Erstkontakt und Konzeption Sanierung Terrasse/Zugang/Wassersystem/Provisorium Grauwasser-Filter-System,



Dezember 2019: 2. Probewohner; Terrasse, Sicht-Windschutz & Zugang neu bauen; Regenwasserfassung/Filter für Testbetrieb einbauen & Provisorium Dachrinnen-Fallrohre ersetzen; zuständige Staatsanwaltschaft untersucht dt. Hersteller wegen möglichem „schwerem Betrug“...starke Frostnächte, Aushub Provisorium zuschütten, Solarbatterie „hat kalt“ und fällt aus (Technikkasten zu wenig gut isoliert), Nachbearbeitung Bad, Böden/Holzoberflächen, Lösung Stromausfälle (Systemabläufe durchchecken – Grund: Gas-Durchlauferhitzer); Behebung undichte Sanitärinstallation Küche




Fazit per 31. Dezember 2019:

- ⇒ 5 Monate Lieferverzögerung
- ⇒ 190% (!) Kostenüberschreitung
- ⇒ 1'500 Stunden nichtgeplanter Zusatzaufwand
- ⇒ Ein Tinyhouse-Projekt ist alles andere als ein „Tiny-Project“...☺
- ⇒ Prüfe wer sich (nicht ganz ewig) bindet...☺
- ⇒ Aus etwas Schlechtem kann man immer etwas Gutes machen... ☺ (s. nächste Seite und Beilage)

1. Januar 2020: Tinyhouse Sörenberg bereit für die ersten Winter-Probebewohner

- ☞ <https://www.vision-futurae.ch/tiny-house-probewohnen>
- ☞ https://www.booking.com/hotel/ch/tinyhouse-sorenberg.de.html?label=gen173nr-1DCAsoLEITd-GlueWhvdXNILXNvcmVuYmVyZ0gzWARoLlgBAZgBB7gBGMgBDNgBA-gBAfg-BAogCAagCBLgC1_e28AXAAgE;sid=670cd42f293d682fb52bb186c6f6f122;breadcrumb=hotel&
- ☞ <https://www.sorenberg.ch/de/detail/poitype/openbookingaccommodation/poi/ferienwohnung-tinyhouse/>

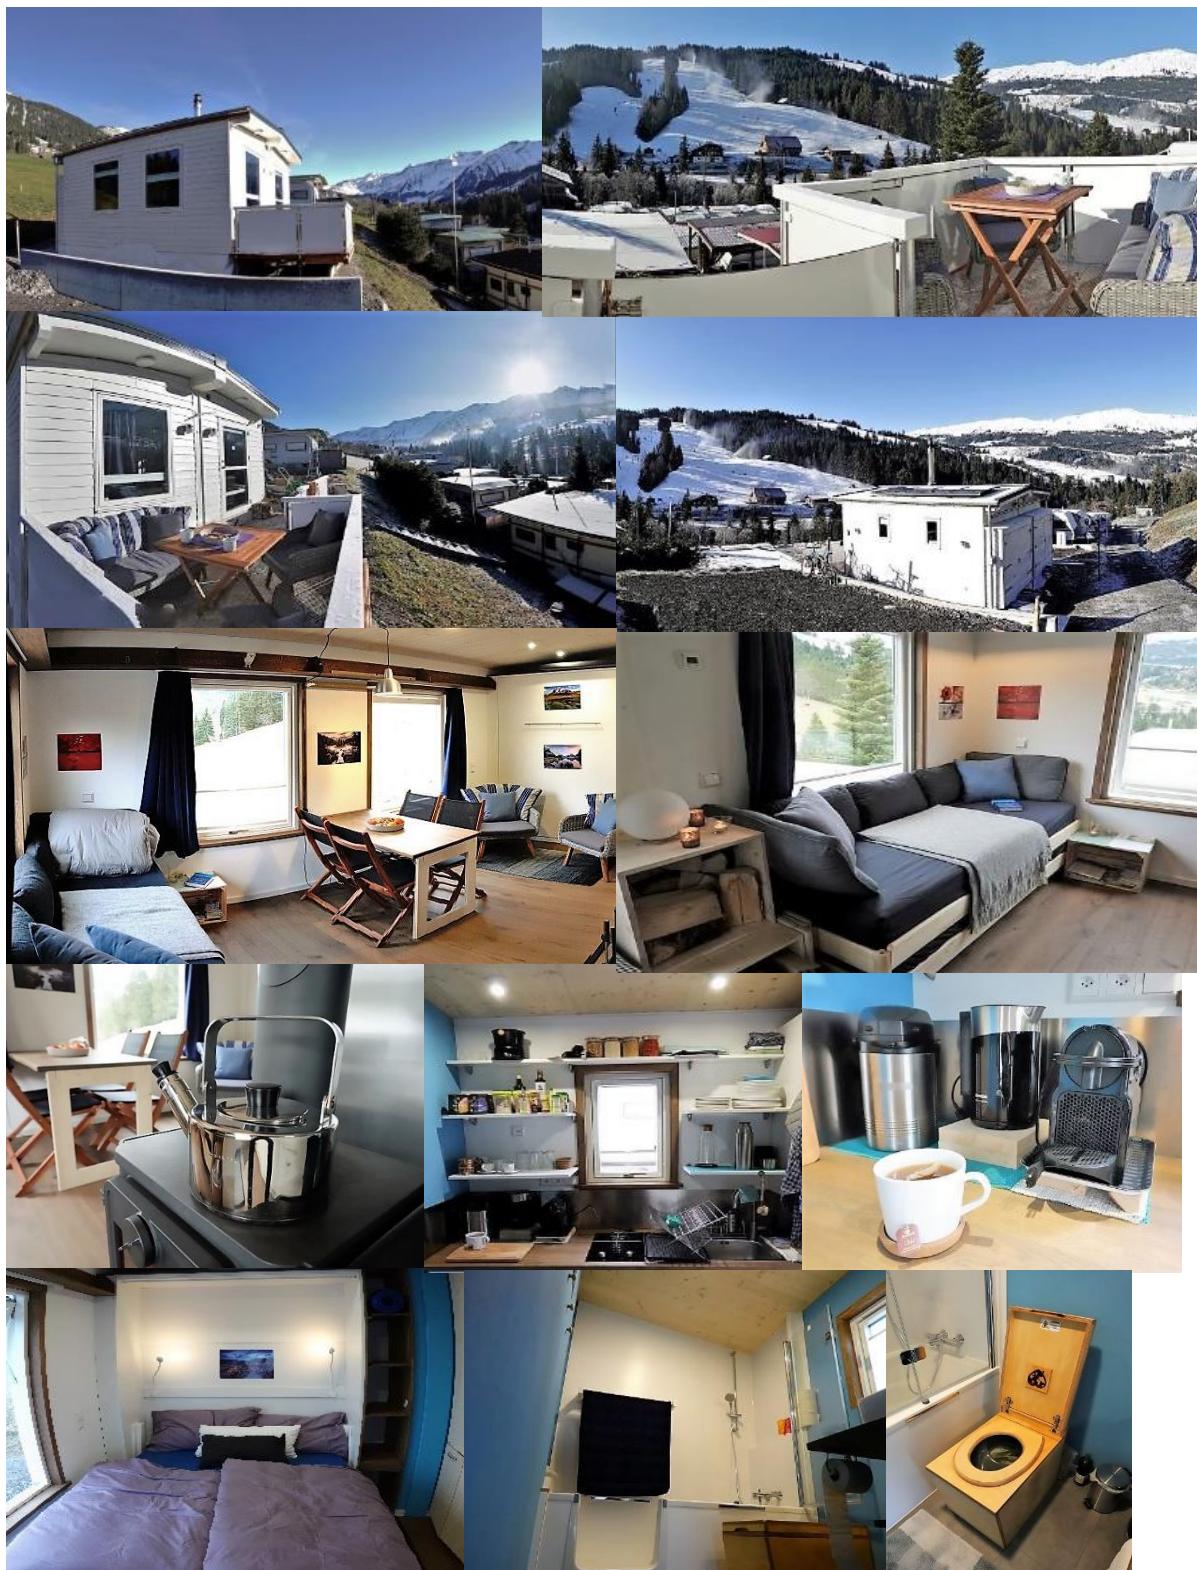

Vorschau Frühling 2020: Wasserautarkie-System (Rückbau Provisorium, Einbau definitive Lösung, Aushub-Drainage – Rohrleitungen neu legen); Wildhecke; Bio-Komposter für Trockentoilette/Gartenabfälle; Vordach
